

RRP2 projektointi

keusote.fi

KeTu 24.5.2023 Erja Pentti

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

Hankkeen perustiedot



Rahoitus

- 11 262 000 €, STM (RRP-rahoitus)



Tausta ja ohjaavat dokumentit

- Hankesuunnitelma liitteineen, v. 6.10.2022
- Rahoituspäätös liitteineen 8.12.2022
- Muut hankkeet
- Keusoten talouden ja toiminnan kestävän kehityksen ohjelma



Tavoite

- Vaikuttavuusperusteinen järjestäminen ja palvelutuotannon ohjaus



Kohderyhmä

- Koko Keusoten alueen väestö sekä palveluiden henkilöstö, sote-palveluiden asiakkaiden lähiomaiset, järjestöt, palveluntuottajat ja kunnat.
- Osaprojekteissa erilaisia tarkempia kohderyhmiä, kuten mm. nuoret aikuiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa, mataloituneesta toimintakyvystä kärsivät ikäihmiset ja diabeetikot



Hankkeen johto

- **Hankejohtaja**
 - Erja Pentti



Organisoituminen

Hankkeen organisoituminen noudattaa olemassa olevien hankkeiden organisoitumista – suurin osa hankehallinnosta pyritään rakentamaan olemassa olevan organisaation sisään.

Hanketoimisto

Hyvinvointialueen johtoryhmä
(Hyvinvointialuejohtaja, konsernin johtajat,
palvelujohtajat)

Johtoryhmä

- Hankesalkun optimointiin liittyvä päätöksenteko (tavoitteet, voimavarat, käynnistettävät projektit)
- Poikkeamat ja ohjaus

Hankkeen ohjausryhmä
(TKKI-johtaja puheenjohtajana, hankkeen
valvoja, johtajat, päälliköt)

Hankkeen ohjausryhmä

- Sidosryhmien osallistaminen
- Hankkeiden etenemisen seuranta, ohjaus ja tuki

Investointipäälliköiden
palaverit (operatiivisesti
integroivat)

Investointipäälliköiden ja
johtajien
palaverit (operatiivisesti
integroivat)

Investointipäälliköiden ja
johtajien palaverit
• Operatiivisesti integroivat
tilannekuvat

Investoinnit 1-4

Muut hankkeet

Keusoten RRP2-hankkeen investointien tiedot

Investointi 1

Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa

Budjetti

5 970 000 €

Investointi 2

Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Budjetti

890 000 €

Investointi 3

Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

Budjetti

1 107 000 €

Investointi 4

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Budjetti

3 295 000 €

Investointi 1 työpaketit

Investointi 1

Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa

Työpaketti 1

Helposti saavutettavat ja vaikuttavat nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Työpaketti 2

Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyvien ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttäminen

Työpaketti 3

Pitkäaikaissairaudesta kärsiville tai pitkäaikaissairauden riskissä oleville mielekäs ja tehokas omahoito ja itse seuranta sekä riittävä palvelutarpeen täyttäminen

Työpaketti 4

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdyspinnan parantaminen

Työpaketti 5

Omaolon ja sähköisen perhekeskuksen toiminnallinen käyttöönotto ja jalkauttaminen

Investointi 2 työpaketti

Investointi 2

Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Työpaketti 1

Hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla

Investointi 3 työpaketit

Investointi 3

Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

Työpaketti 1

Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

Työpaketti 2

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Työpaketti 3

Diabeteksen palveluketjujen ja ikäihmisten palveluketjujen vaikuttavuuspilotit

Investointi 4 työpaketit

Investointi 4

Otetaan käyttöön
hoitotakuuta edistävät
palvelumuotoillut
digitaaliset innovaatiot

Työpaketti 1

Toiminnanohjaus
(Henkilöstön
resurssien
ohjaus)

Työpaketti 2

Väestön palvelutarpeen
ennakointi edistyneiden
tietojohtamisen
ratkaisuissa
(palveluketjujen ohjaus
ja koordinaatio)

Työpaketti 3

Ammattilaisten
digitaaliset
työvälineet

Työpaketti 4

Työ- ja
toimintakyvyn
digitaalinen
itsearviointi

Työpaketti 5

Kansalaisten
etäpalvelut

Työpaketti 6

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kansallisen
palvelukonseptin digitaaliset
ratkaisut

Työpaketti 7

Omasalkku, digitaalinen
oma- ja itsehoidon
innovaatio

Hanketyön vaiheistaminen vuosille 2023-2025



Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024 Q4/2024 Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025





Euroopan unionin
rahoittama
NextGenerationEU



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Investointi 1 toimenpiteet

Investointi 1 työpaketin 1 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 1

Helposti
saavutettavat ja
vaikuttavat nuorten
ja nuorten aikuisten
mielenterveys- ja
päihdepalvelut

Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöisten aikuisten asiakasohjauksen
kehittäminen 2023-2024

Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöisten aikuisten avokuntoutuksen
kehittäminen ja pilotointi 2023-2024

Mielenterveys- ja päihdehäiriöisten nuorten ja nuorten aikuisten sähköisten
palvelujen integrointi 2023-2024

Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöisten aikuisten palveluketjun digitalisointi
2024-2025

Investointi 1 työpaketti 2 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 2

Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyvien ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttäminen

Toimintakykyä tukevan moniammatillinen toimintamallin kehittäminen ympärivuorokautisessa asumispalvelussa ja kotona asumisessa 2023-2025

Omaishoitomallin kehittäminen 2023-2024

Asiakasohjauksen kehittäminen eri asumismuodoille 2023-2025

Moniammatillisen työnjaon kehittäminen 2023-2025

Investointi 1 työpaketti 3 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 3

Pitkäaikaissairaudesta
kärsiville tai
pitkäaikaissairauden
riskissä oleville
mielekkäs ja tehokas
omahoito ja
itseseuranta sekä
riittävä palvelutarpeen
täyttäminen

Monialaisen asiakasohjauksen ja vastaanottoimintamallin
kehittäminen 2023-2025

Diabeteskeskuksen kehittäminen 2023-2025

Pitkäaikaissairaiden hoidon kehittäminen perusterveydenhuollossa
2023-2025

Monialaisen palvelumallin kehittäminen tuki- ja liikuntasairaille
2023-2025

Koronapandemian aikana työelämästä pudonneiden
pitkäaikaissairaiden tai pitkäaikaissairauden uhatta olevien
työllistymisen tukeminen monialaisen mallin avulla 2023

Investointi 1 työpaketti 4 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 4

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdyspinnan parantaminen

ESH PTH vaikuttavuus

Kuntoutuksen ja kotiutuksen palveluketjujen kehittäminen 2023-2025

Pilotti hallitusta potilassiirrosta päivystyksestä perusterveydenhuoltoon potilasvirtojen optimointiin 2024-2025

Päivystyksen tehostaminen 2023-2025

Investointi 1 työpaketti 5 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 5

Omaolon ja
Sähköisen
perhekeskuksen
toiminnallinen
käyttöönotto ja
jalkauttaminen

Omaolon integraatio palveluprosesseihin ja tarvittaviin järjestelmiin 2023-2025

Omaolon ja muiden tarvittavien oirearvioiden liittäminen palveluprosessiin
2023-2025

Omaolon palveluohjausten teknisten toimenpiteiden integrointi jatkuviin
palveluihin 2023


Omaolon palvelupolkujen konseptointi ja yhdistäminen asiakasohjaukseen
2024-2025

Sähköisen perhekeskuksen toimintojen käyttöönotto ja liittäminen Omaoloon
2024-2025

Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen 2023-2025

Investointi 2 toimenpiteet

Investointi 2 työpaketti 1 toimenpiteet

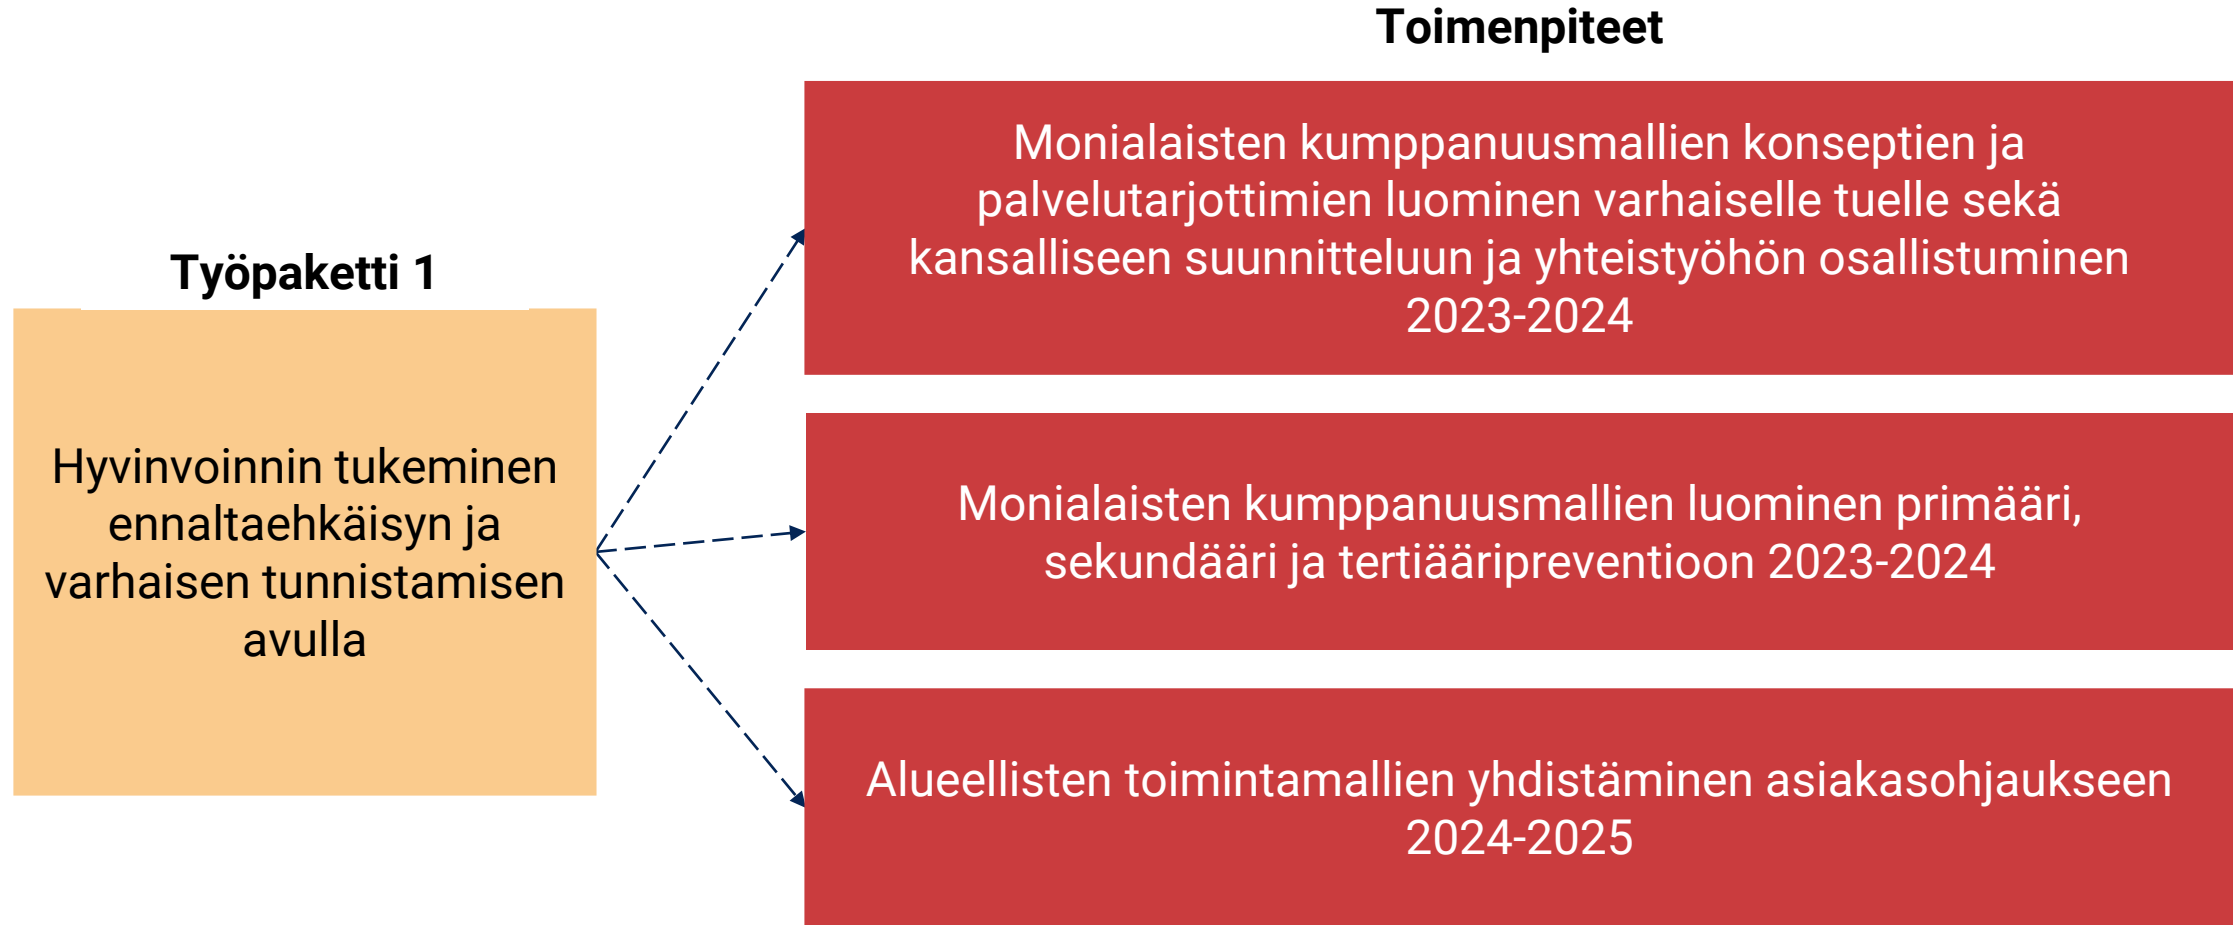

Investointi 3 toimenpiteet

Investointi 3 työpaketti 1 toimenpiteet

Työpaketti 1

Kirjaamiskäytäntöjen
kehittäminen

Toimenpiteet

Toimintamallin luominen kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen 2023-2024

Investointi 3 työpaketti 2 toimenpiteet

Työpaketti 2

Rakenteellisen
sosiaalityön
raportoinnin
kehittäminen

Toimenpiteet

Toimintamallin luominen sosiaalityön raportoinnin
kehittämiseen 2023-2024

Investointi 3 työpaketti 3 toimenpiteet

Toimenpiteet

Työpaketti 3

Diabeteksen
palveluketjujen ja
ikäihmisten
palveluketjujen
vaikuttavuuspilotit

Ohjausmallin kehittäminen

Diabeteksen palveluketjun vaikuttavuustiedon kerääminen
ja visualisointi ohjauksen mahdollistamiseksi /
vaikuttavuuspilotti 2023-2025

Ikäihmisten palveluiden vaikuttavuustiedon hyödyntäminen
ohjauksessa / vaikuttavuuspilotti 2024-2025

Investointi 4 toimenpiteet

Investointi 4 työpaketti 1 toimenpiteet

Työpaketti 1

Toiminnanohjaus
(Henkilöstön
resurssien
ohjaus)



Toimenpiteet

Ennustemallin kehittäminen henkilöstön resurssien hallintaan
2023-2025

Investointi 4 työpaketti 2 toimenpiteet


Työpaketti 2

Väestön palvelutarpeen
ennakointi edistyneiden
tietojohdamisen
ratkaisuissa
(palveluketjujen ohjaus
ja koordinaatio)

Toimenpiteet

Asiakassegmentoinnin laajentaminen ja ennustemallin
rakentaminen 2023-2025

Investointi 4 työpaketti 3 toimenpiteet

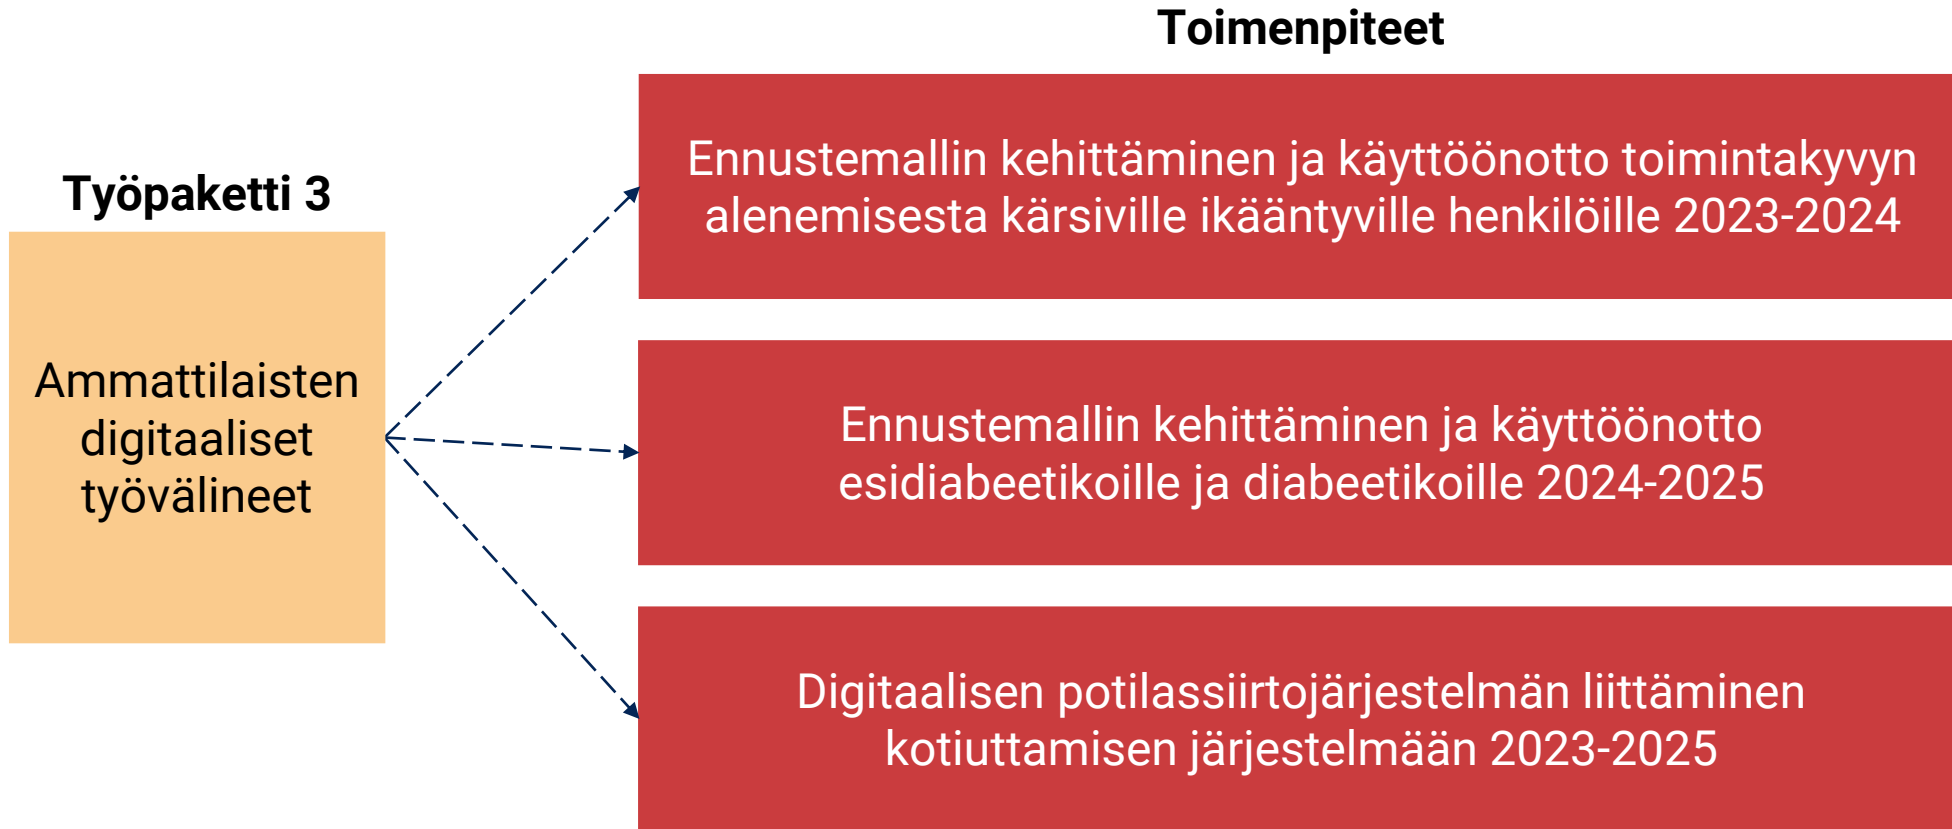

Investointi 4 työpaketti 4 toimenpiteet

Työpaketti 4

Työ- ja
toimintakyvyn
digitaalinen
itsearviointi

Toimenpiteet

Sähköisen itsearviointivälineen kehittäminen työ- ja
toimintakyvyn arviointiin 2023-2025

Investointi 4 työpaketti 5 toimenpiteet

Työpaketti 5

Kansalaisten
etäpalvelut



Toimenpiteet

Sähköisen asiointin portaalin kehittäminen ja käyttöönotto
2023-2025

Investointi 4 työpaketti 6 toimenpiteet

Työpaketti 6

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut



Toimenpiteet

Palvelukonseptin kansallisten kriteerien määrittely, kansallisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen & alueellisten digitaalisten palvelutarjottimien käyttöönotto 2023-2025

Investointi 4 työpaketti 7 toimenpiteet

Työpaketti 7

Omasalkku, digitaalinen
oma- ja itsehoidon
innovaatio



Toimenpiteet

Omasalkun pilotointi 2023-2025

Hankkeen eteneminen

- Alkuvuosi
 - Hankkeen projektointi
 - Hankesuunnitelman päivittäminen STM:lle
- Viimeisen kuukauden aikana
 - Aloitettu sisältöjä syventävät keskustelut työpakettien omistajien ja projektijohdon* kanssa
- Työn alla
 - Työpakettikohtaiset tavoitteet ja mittarit
 - Palveluketjujen nivominen RRP-hankkeeseen
 - Ensi syksyn suunnittelua
 - Projektipäälliköiden rekrytoinnin aloittaminen
- Kokonaisuus
 - Edennyt aikataulun mukaisesti
 - Lomien jälkeen elokuussa aloitetaan toimenpiteiden käytäntöjen edistämistyö

(omistajat=palvelujen johtajisto, projektijohto=tulosalueen päälliköitä ja asiantuntijoina)
